

< 별첨 1> 측정결과 - 4월 24일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.5	241	2530.5	0.003	미만
2		10.8	240	2592.0	0.002	미만
3		10.7	241	2578.7	0.001	미만
4		10.9	242	2637.8	0.002	미만
5	위생설비 입구	10.6	40	424.0	0.001	미만
6		10.3	41	422.3	0.002	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.4	42	436.8	0.002	미만
8		10.7	41	438.7	0.002	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.5	40	420.0	0.001	미만
10		10.9	40	436.0	0.002	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.8	120	1296.0	0.004	미만
12		10.4	120	1248.0	0.002	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.7	119	1273.3	0.002	미만
14		10.6	119	1261.4	0.003	미만
15	폐기물 반출구	10.5	40	420.0	0.001	미만



에코앤티텍주식회



[illegible]

공 사 명	문학경기장의 1역 석면함유 건축감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측정일 시	2017년 4월 24일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해체업체	부친건업(주)	측 정 업체	에코엔텍 주식회사 (T.032715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 4월 25일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.7	240	2568.0	0.002	미만
2		10.9	240	2616.0	0.001	미만
3		10.6	240	2544.0	0.002	미만
4		10.8	240	2592.0	0.002	미만
5	위생설비 입구	10.4	41	426.4	0.001	미만
6		10.5	41	430.5	0.002	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.7	40	428.0	0.001	미만
8		10.6	40	424.0	0.002	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.9	39	425.1	0.001	미만
10		10.8	40	432.0	0.001	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.3	121	1246.3	0.002	미만
12		10.5	120	1260.0	0.002	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.7	120	1284.0	0.001	미만
14		10.9	120	1308.0	0.002	미만
15	폐기물 반출구	10.6	39	413.4	0.001	미만




에코앤티텍주식회사



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 지하1층 >

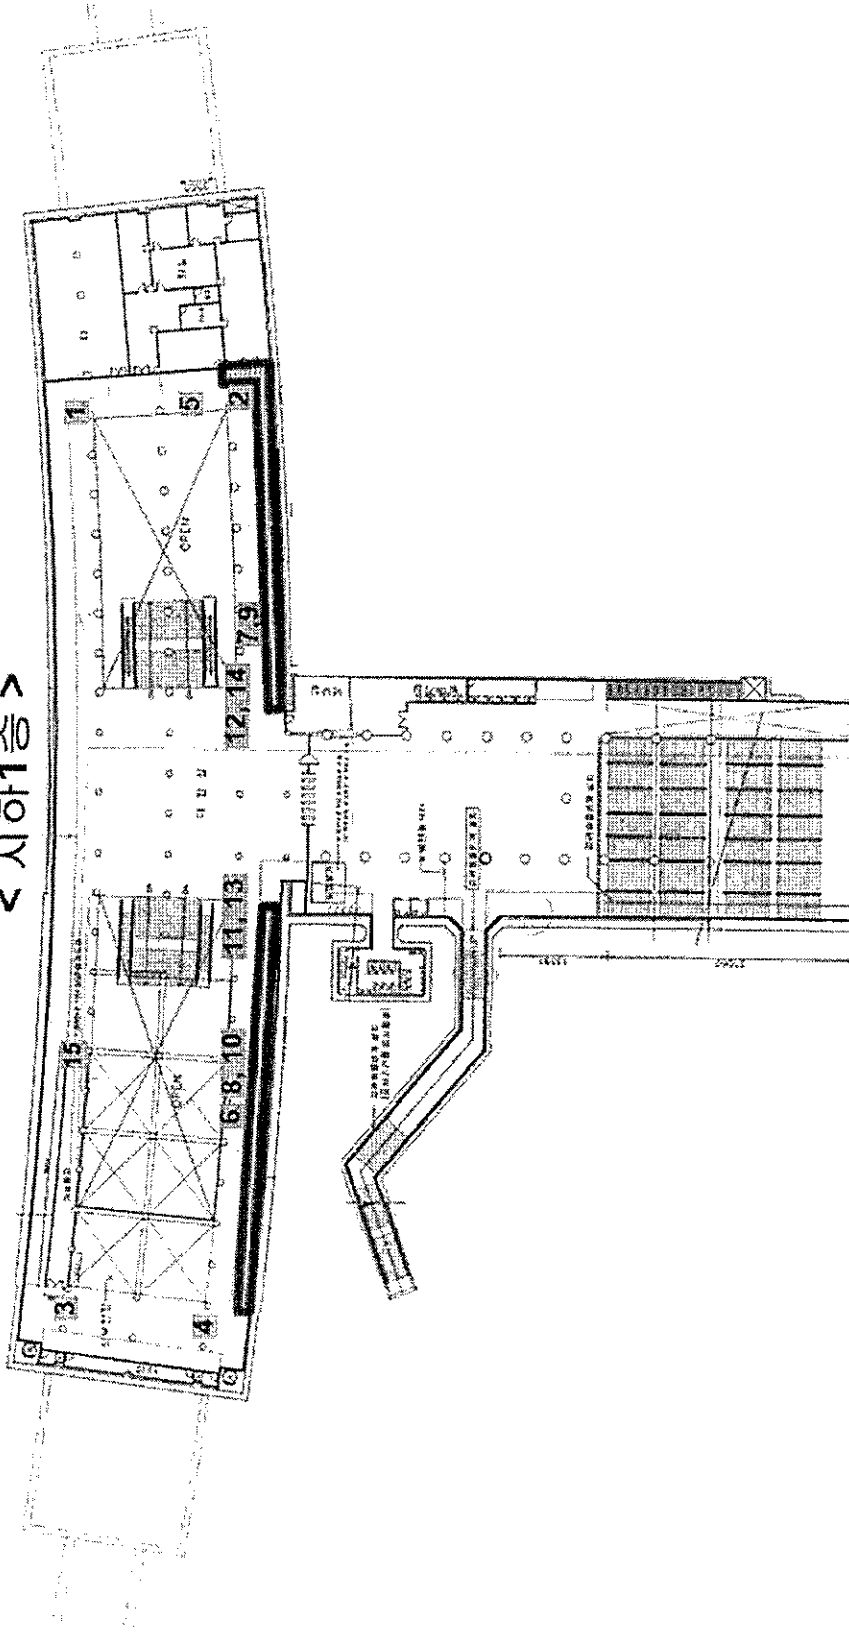

공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측 정 일 시	2017년 4월 25일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설(주)	측 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 4월 26일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.4	240	2496.0	0.002	미만
2		10.6	238	2522.8	0.002	미만
3		10.3	240	2472.0	0.004	미만
4		10.5	239	2509.5	0.003	미만
5	위생설비 입구	10.9	40	436.0	0.002	미만
6		10.5	41	430.5	0.001	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.7	41	438.7	0.001	미만
8		10.8	40	432.0	0.003	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.6	42	445.2	0.003	미만
10		10.9	41	446.9	0.004	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.4	121	1258.4	0.002	미만
12		10.6	120	1272.0	0.001	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.9	119	1297.1	0.001	미만
14		10.7	120	1284.0	0.002	미만
15	폐기물 반출구	10.5	40	420.0	0.001	미만




에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 지하1층 >

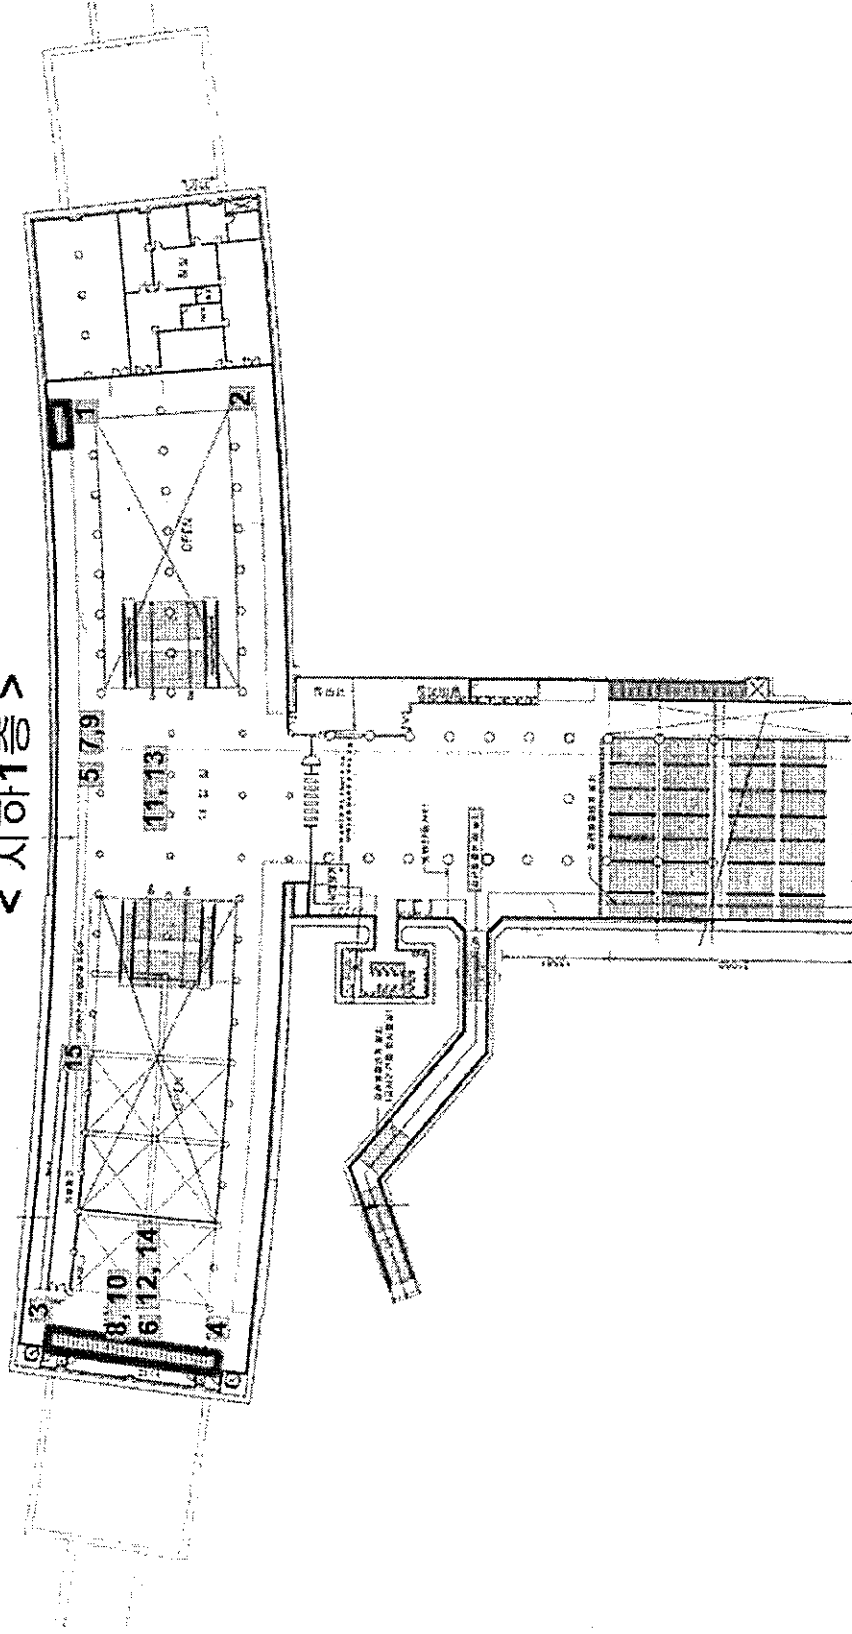

공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측정 일시	2017년 4월 26일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설(주)	측 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 4월 27일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.8	228	2462.4	0.002	미만
2		10.9	225	2452.5	0.003	미만
3		10.5	229	2404.5	0.003	미만
4		10.7	226	2418.2	0.004	미만
5	위생설비 입구	10.6	38	402.8	0.002	미만
6		10.4	39	405.6	0.001	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.3	40	412.0	0.002	미만
8		10.8	40	432.0	0.003	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.5	39	409.5	0.002	미만
10		10.9	39	425.1	0.002	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.4	118	1227.2	0.002	미만
12		10.8	117	1263.6	0.002	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.7	119	1273.3	0.003	미만
14		10.5	118	1239.0	0.003	미만
15	폐기물 반출구	10.6	39	413.4	0.001	미만




에코앤티텍주식회




< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)

< 지하1층 >

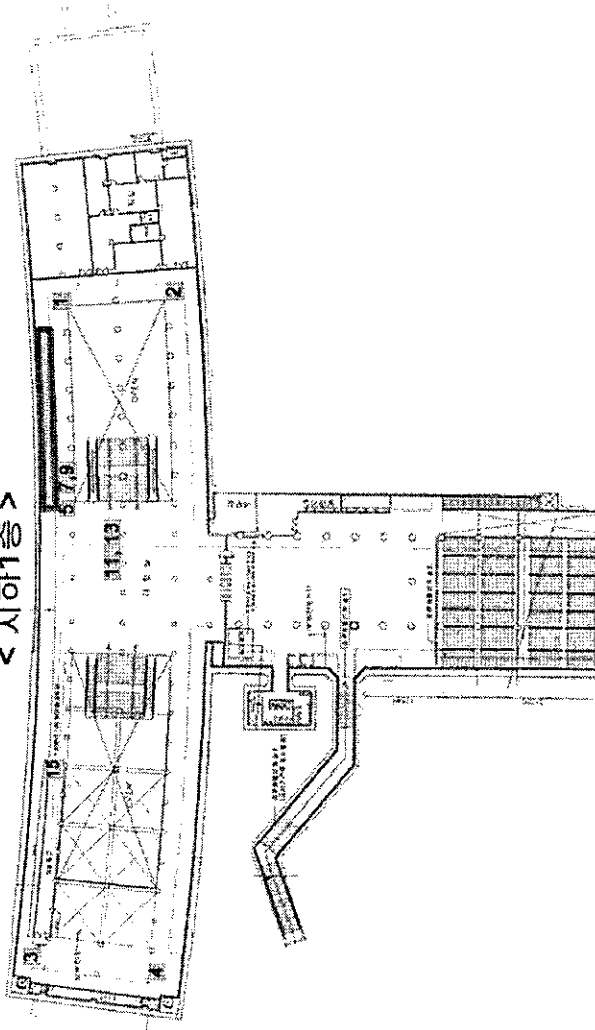

< 지하2층 >



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측 정 일 시	2017년 4월 27일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설(주)	측 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)
