


< 별첨 1> 측정결과 - 6월 8일 (6월 7일 야간) 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)



시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.8	225	2430.0	0.001	미만
2		10.5	229	2404.5	0.000	미만
3		10.9	224	2441.6	0.001	미만
4		10.6	227	2406.2	0.000	미만
5	위생설비 입구	10.7	38	406.6	0.000	미만
6		10.4	39	405.6	0.000	미만
7	음압기 배출구	10.8	39	421.2	0.001	미만
8		10.3	39	401.7	0.000	미만
9	작업장 주변 (실내)	10.5	115	1207.5	0.000	미만
10		10.6	114	1208.4	0.000	미만
11	폐기물 반출구	10.9	37	403.3	0.000	미만



에코앤티텍주식회사



< 별첨 2 > 축정 지점 위치 (도식도)

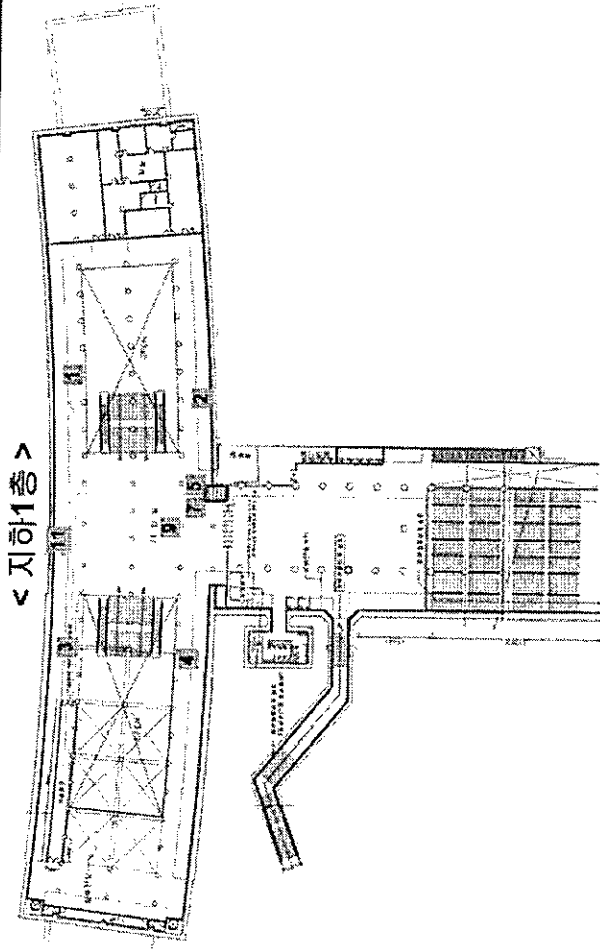

공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
축 정 일 시	2017년 6월 8일 (6월 7일 야간)	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설㈜	축 정 업 체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 6월 9일 (6월 8일 야간) 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.7	226	2418.2	0.001	미만
2		10.9	224	2441.6	0.000	미만
3		10.6	227	2406.2	0.001	미만
4		10.8	225	2430.0	0.000	미만
5	위생설비 입구	10.6	38	402.8	0.000	미만
6	음압기 배출구	10.3	39	401.7	0.001	미만
7	작업장 주변 (실내)	10.8	115	1242.0	0.002	미만
8		10.4	117	1216.8	0.002	미만
9		10.5	116	1218.0	0.004	미만
10	폐기물 반출구	10.6	38	402.8	0.000	미만



에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 축정 지점 위치 (도식도)

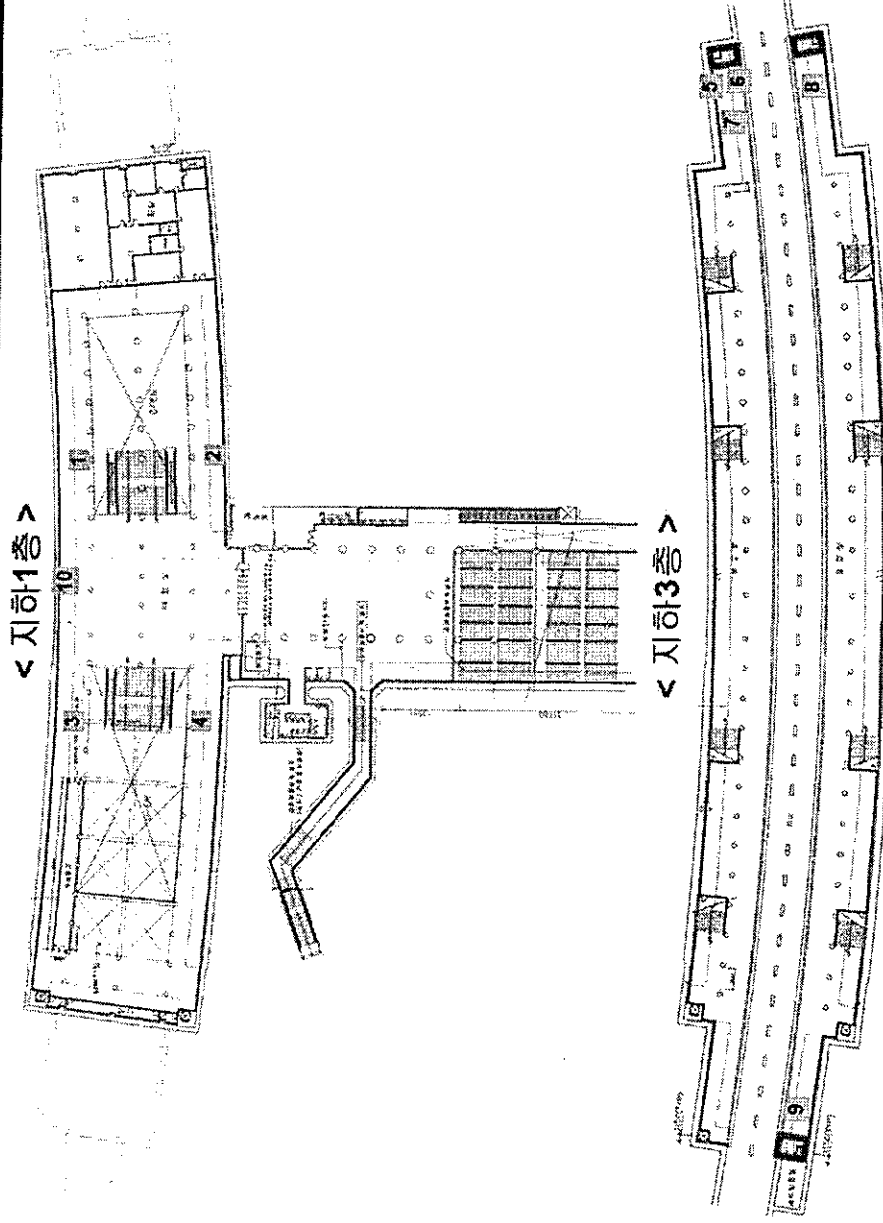

공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
축 정 일 시	2017년 6월 9일 (6월 8일 야간)	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설㈜	축 정 업 체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)
